RICHARD CARPENTER DITCH Nº 2443 WOOD COUNTY

1/14

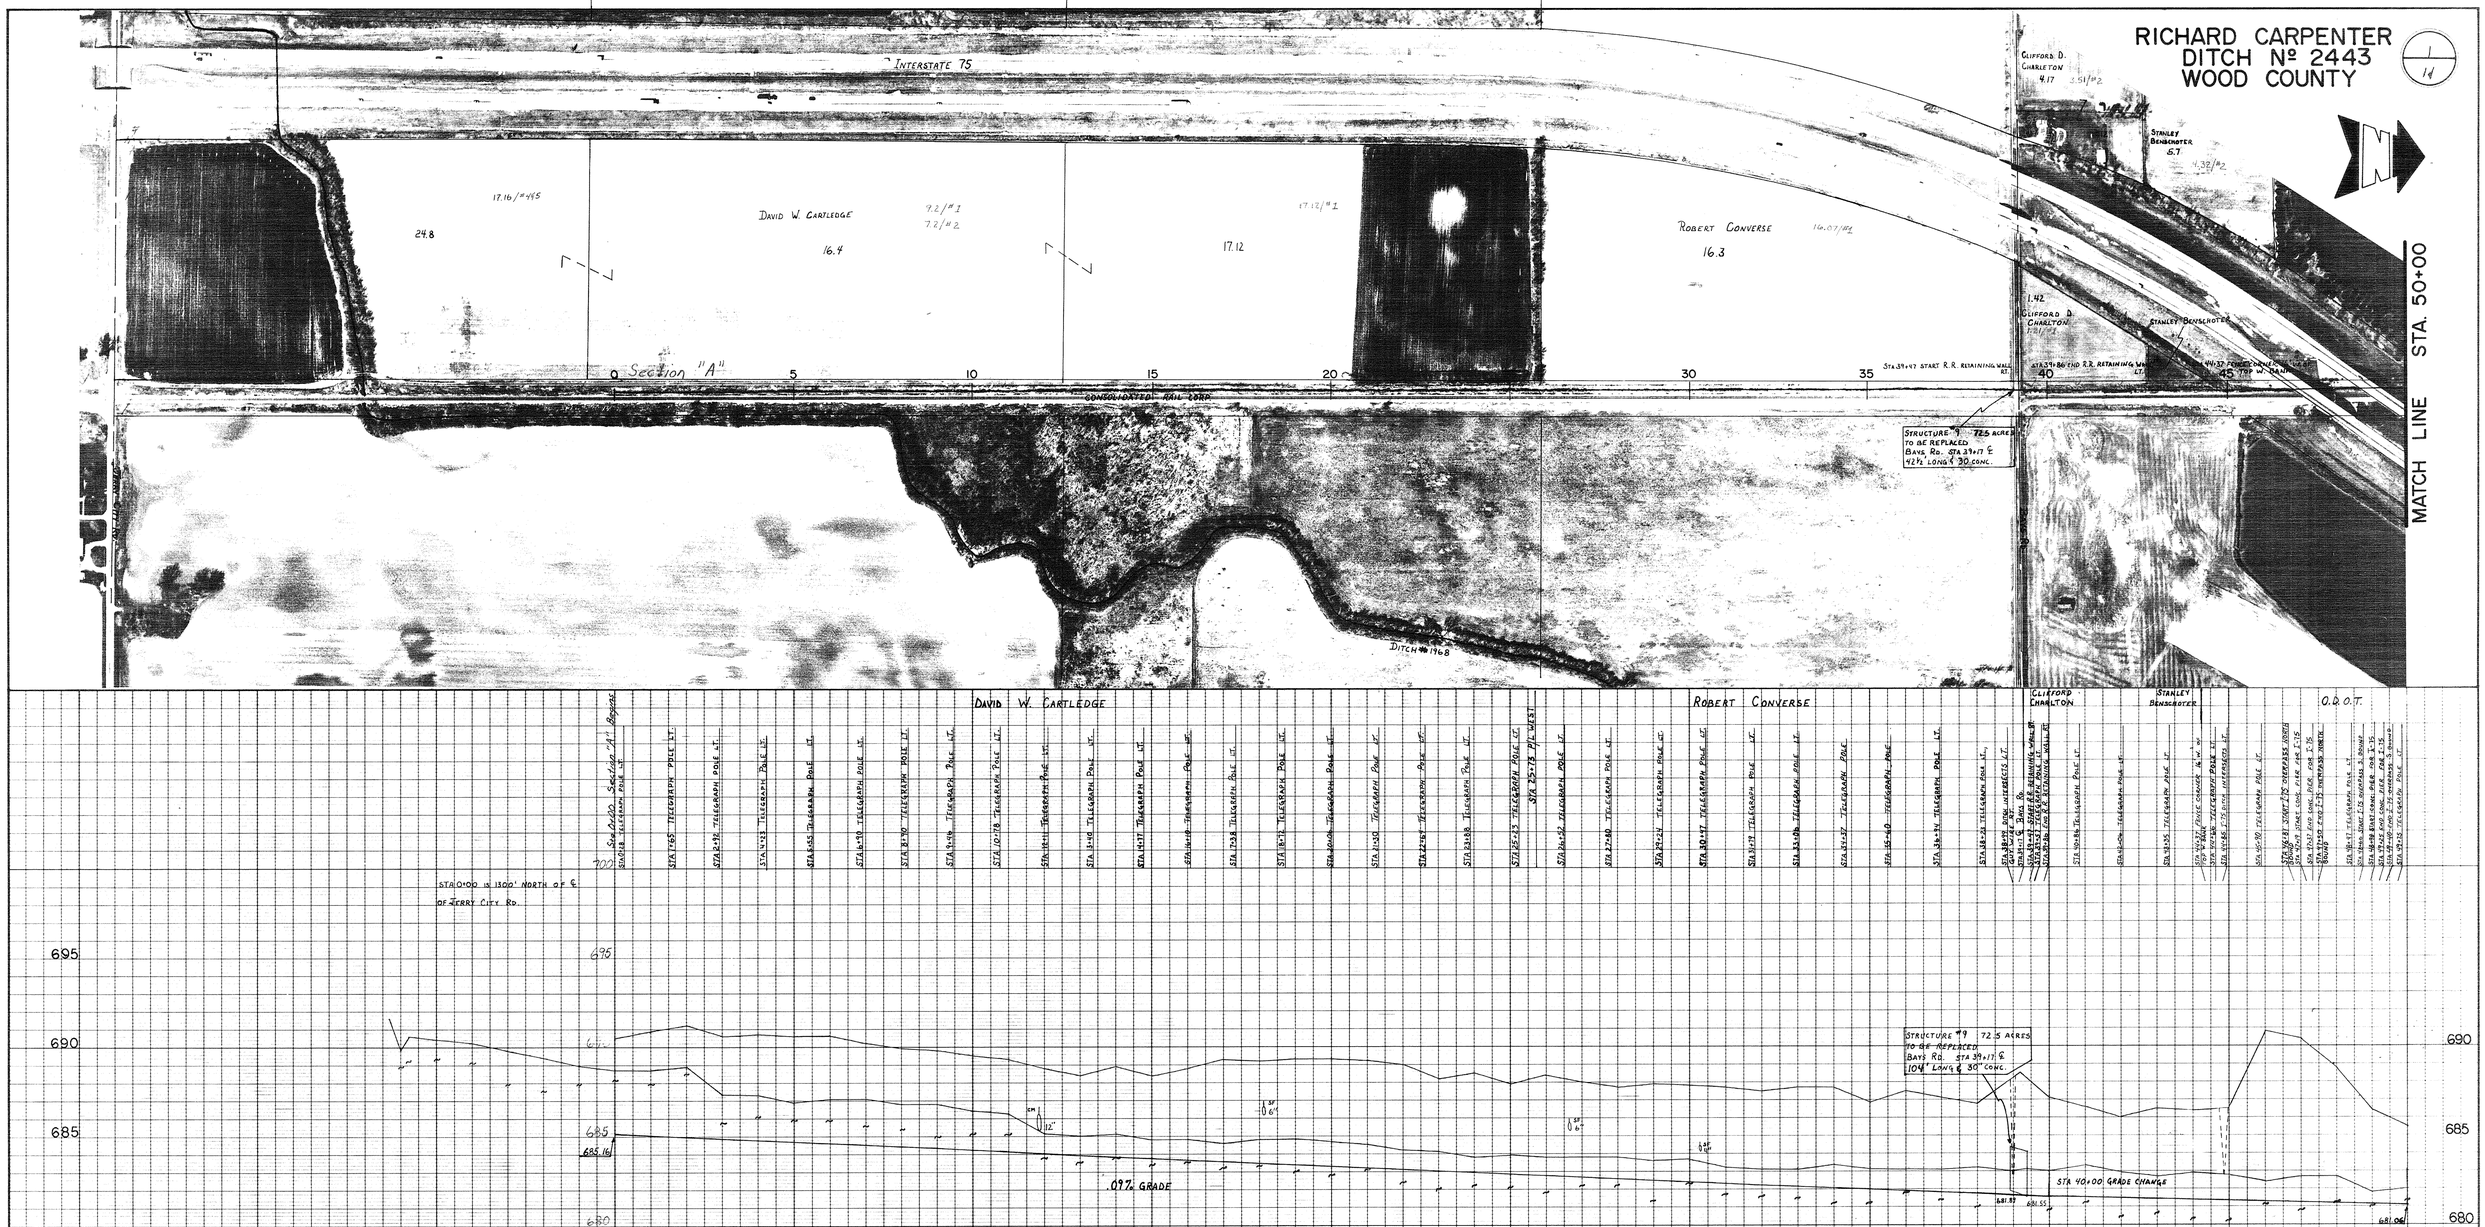

NOTE: #601 Rock Channel Protection Type "C" without bedding be placed at the following location

Sta. 0+00 @ Inlet	8 Ton	
Sta. 166+00 100' North Side	52 Ton	
Field Washouts	26 Ton	

STA.	CUT	GRADE	STAKE
0	5.34	685.16	690.5
	5.83	685.07	690.9
	6.22	684.98	691.2
	5.71	684.81	690.6
	5.90	684.80	690.7
5	5.89	684.71	690.6
	5.98	684.62	690.6
	5.67	684.53	690.2
	5.46	684.44	689.9
	5.45	684.35	689.8
10	5.24	684.26	689.5
	5.13	684.17	689.3
	4.72	684.08	688.8
	4.41	683.99	688.4
	5.00	683.90	688.9
15	4.59	683.81	688.4
	5.08	683.72	688.8
	5.67	683.63	688.3
	5.66	683.54	688.2
	5.85	683.45	688.3
20	5.94	683.36	688.3
	5.93	683.27	688.2
	5.82	683.18	688.0
	5.11	683.09	688.2
	5.50	683.00	688.5
25	4.99	682.91	687.9
	5.58	682.82	688.4
	5.27	682.73	688.0
	5.06	682.64	687.7
	5.35	682.55	687.9
30	5.34	682.46	687.8
	5.33	682.37	687.7
	5.22	682.28	687.5
	5.51	682.19	687.7
	5.60	682.10	687.7
35	4.89	682.01	686.9
	5.58	681.92	687.5
	5.27	681.83	687.1
	5.06	681.74	686.8
40	5.54	681.56	687.1
	5.09	681.51	686.6
	4.54	681.46	686.0
	5.09	681.41	686.5
	5.04	681.36	686.4
45	2.59	681.31	683.9
	9.54	681.26	690.8
	9.19	681.21	690.4
	7.64	681.16	688.8
	5.27	681.11	686.4
50	4.44	681.06	685.5

STA. 0+00 to STA. 50+00
