Weiland Ditch

Ditch #2305 Perrysburg Twp. Wood County

Max L. Rothschild - Engineer

Ditch book # 143
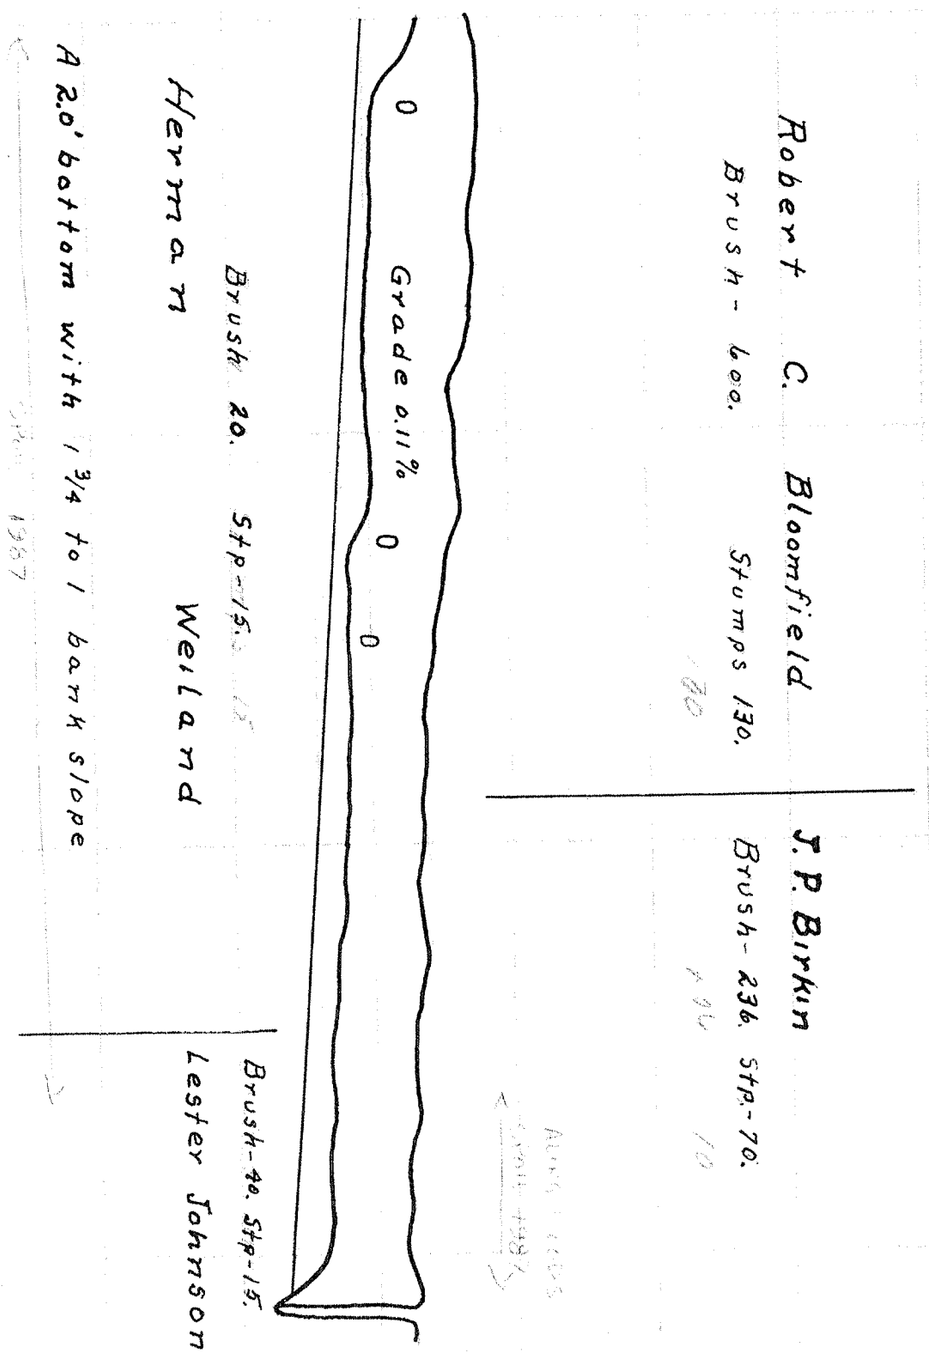
Station	Stake	Grade	Cut	Cu. Yds
0	653.93			
1	654.07			
2	654.05	650.00	4.05	0
3	654.12	649.89	4.23	
4	654.02	649.78	4.24	40
5	653.75	649.67	4.08	
6	653.85	649.56	4.29	70
7	653.71	649.45	4.26	
8	653.51	649.34	4.17	70
9	652.97	649.23	3.74	
10	653.08	649.12	3.96	70
11	653.17	649.01	4.16	
12	653.31	648.90	4.41	70
13	652.79	648.79	4.00	
14	652.56	648.68	3.88	59
15	652.26	648.57	3.69	
16	652.11	648.46	3.65	51
17	651.83	648.35	3.48	
18	651.98	648.24	3.74	51
19	651.77	648.13	3.64	
20	651.81	648.02	3.79	65
21	651.62	647.91	3.71	
22	651.82	647.80	4.02	44
23	651.86	647.69	4.17	
24	651.65	647.58	4.07	48
25	651.39	647.47	3.92	
26	651.40	647.36	4.04	59
27	651.42	647.25	4.17	
28	651.15	647.14	4.01	59
29	651.15	647.03	4.12	
30	651.23	646.92	4.11	66
31	651.45	646.81	4.64	52
31+35	650.90			
	Total Cu. Yds.			864
