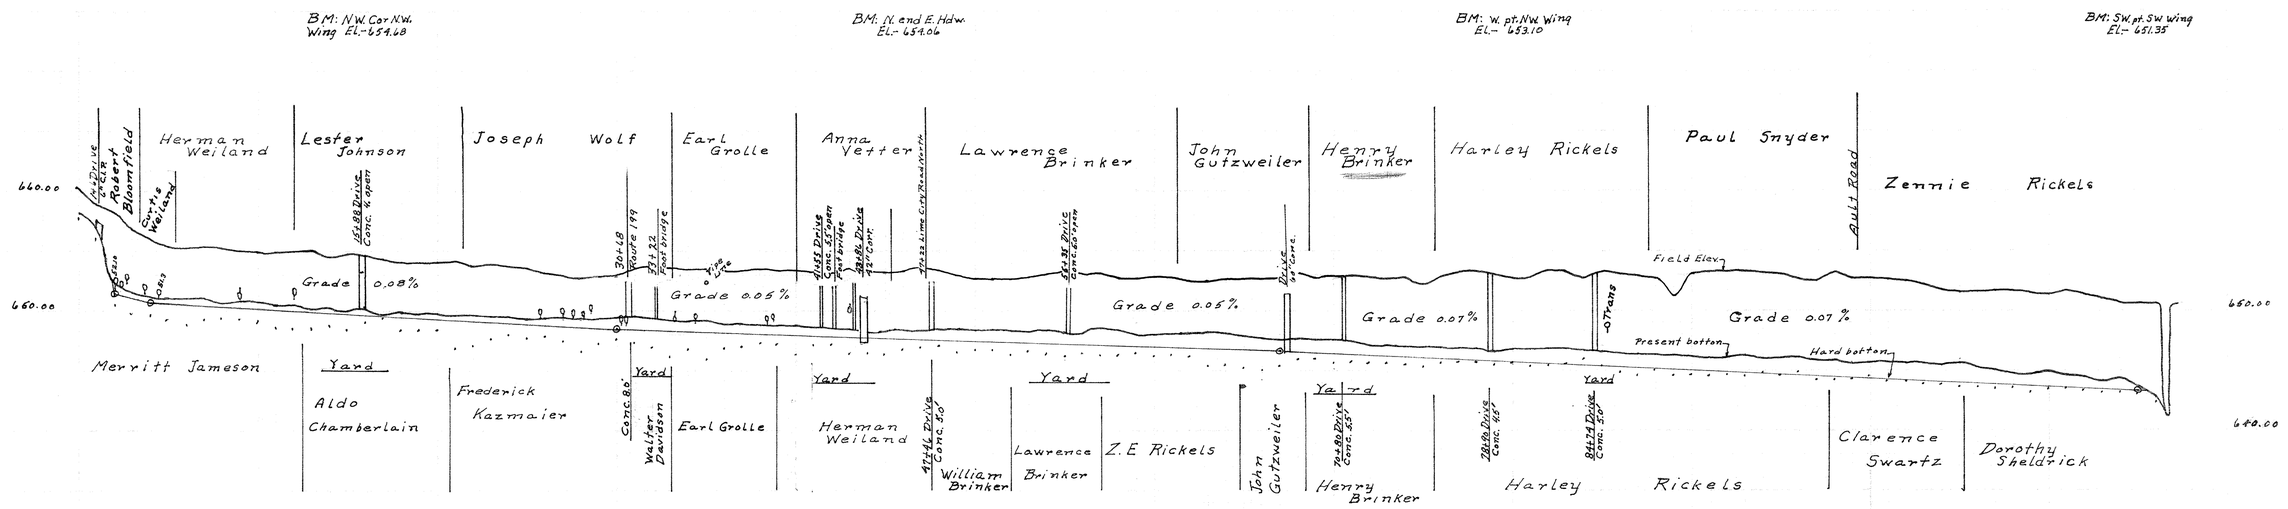

Station	Stake	Grade	Cut	Cu. Yds.
0	664.32	Stop work at 1+75		
1	658.88	651.51	6.47	10
2	658.18	651.07	5.70	
3	656.77	650.63	5.38	83
4	656.01	650.19	5.82	
5	655.34	649.75	5.59	86
6	655.35	649.47	5.88	
7	655.46	649.39	5.06	
8	655.23	649.31	4.92	76
9	655.03	649.23	4.77	
10	654.94	649.15	4.79	74
11	654.98	649.07	4.91	
12	655.23	648.99	5.24	81
13	655.05	648.91	5.14	
14	654.54	648.83	4.71	74
15	654.84	648.75	5.09	
16	654.72	648.67	5.05	78
17	654.31	648.59	4.72	
18	654.45	648.51	4.94	76
19	654.02	648.43	4.59	
20	654.09	648.35	4.74	73
21	654.09	648.27	4.83	
22	653.74	648.19	4.55	70
23	653.73	648.11	4.62	
24	653.71	648.03	4.68	72
25	653.34	647.95	4.39	
26	653.02	647.87	4.30	66
27	653.17	647.79	4.37	
28	653.09	647.71	4.30	66
29	652.74	647.63	4.09	
30	652.87	647.55	4.32	67
31	652.46	647.47	4.00	
32	652.20	647.39	3.81	59
33	653.03	647.31	4.72	
34	653.60	647.23	5.37	83
35	653.41	647.15	5.26	
36	653.48	647.07	5.41	84
37	653.46	646.99	5.47	
38	653.35	646.91	5.44	84
39	653.38	646.83	5.55	
40	653.41	646.75	5.66	87
41	653.32	646.67	5.65	
42	653.23	646.59	5.64	87
43	653.17	646.51	5.66	
44	653.34	646.43	5.91	91
45	653.10	646.35	5.75	
46	653.29	646.27	5.94	92
47	653.37	646.19	6.18	
48	653.32	646.11	6.21	96
49	653.02	646.03	6.01	
50	652.74	645.95	5.79	89
51	652.44	645.87	5.57	
52	652.27	645.79	5.48	84
53	652.28	645.71	5.57	
54	652.31	645.63	5.68	87
55	652.20	645.55	5.65	
56	652.02	645.47	5.55	85
57	652.09	645.39	5.70	
58	652.05	645.31	5.74	89
59	652.11	645.23	5.88	
60	652.10	645.15	5.95	92
61	652.81	645.07	5.74	
62	652.76	644.99	5.77	89
63	652.41	644.91	5.50	
64	652.34	644.83	5.51	85
65	652.73	644.75	5.98	
66	652.70	644.67	6.03	93
67	652.44	644.59	5.85	
68	652.70	644.51	6.19	96
69	652.77	644.43	6.34	
70	652.76	644.35	6.41	99
71	652.70	644.27	6.43	
72	652.85	644.19	6.66	103
73	652.50	644.11	6.39	
74	652.48	644.03	6.45	100
75	652.93	643.95	6.98	
76	652.84	643.87	6.97	108
77	653.20	643.79	7.41	
78	653.24	643.71	7.53	117
79	652.82	643.63	7.19	
80	652.81	643.55	7.26	112
81	653.27	643.47	7.80	
82	653.35	643.39	7.96	123
83	653.70	643.31	8.39	
84	653.88	643.23	8.65	134
85	653.48	643.15	8.33	
86	653.29	643.07	8.22	127
87	653.25	642.99	8.26	
88	653.77	642.91	8.86	137
89	651.74	642.83	8.91	
90	653.16	642.75	8.41	130
91	653.20	642.67	8.53	
92	653.28	642.59	8.69	134
93	653.17	642.51	8.66	
94	653.17	642.43	8.74	135
95	652.94	642.35	8.59	
96	652.64	642.27	8.37	129
97	652.48	642.19	8.29	
98	653.25	642.11	8.14	126
99	652.72	642.03	8.69	
100	652.89	641.95	8.94	138
101	652.78	641.87	8.91	
102	652.53	641.79	8.74	135
103	652.18	641.71	8.47	
104	651.83	641.63	8.20	127
105	651.47	641.55	7.92	
106	651.42	641.47	7.95	123
107	651.42	641.39	7.97	
108	651.24	641.31	7.93	122
109	651.54	641.23	8.31	
110	651.57	641.15	8.42	130
111	651.73	641.07	8.66	
112	651.24	640.99	8.25	127
113	650.98	640.91	8.07	
114	650.41	640.83	7.58	117
115	650.45	640.75	7.70	
116	650.66	No work past 116+40		

20' Bottom - 1:1 3/4 Bank slope
Cut Bank as shown on X-sections

MD-8-10-80
8-11-71

	Brush	Trees	Stumps
Merritt Jameson	100.00 120.	65.00 66.	13.00
Earl Grollie	14.00 18.		5.00
Lawrence Brinker		20.00 77.	12.00
Z.E. Rickels		40.00 44	5.00
John Gutzweller		30.00 27	3.00
Harley Rickels	90.00 108.	140.00 154.	25.00
Clarence Swartz	36.00 47.		12.00
Webster Twp	7.00	80.00 88	4.00
			4.00

Total 789.

PLAT OF
HERMAN WEILAND DITCH #2322

Book 147 & 148

WEBSTER TWP., WOOD COUNTY OHIO

JULY 1969, WOOD COUNTY ENGINEER

MAX L. ROTHSCHILD
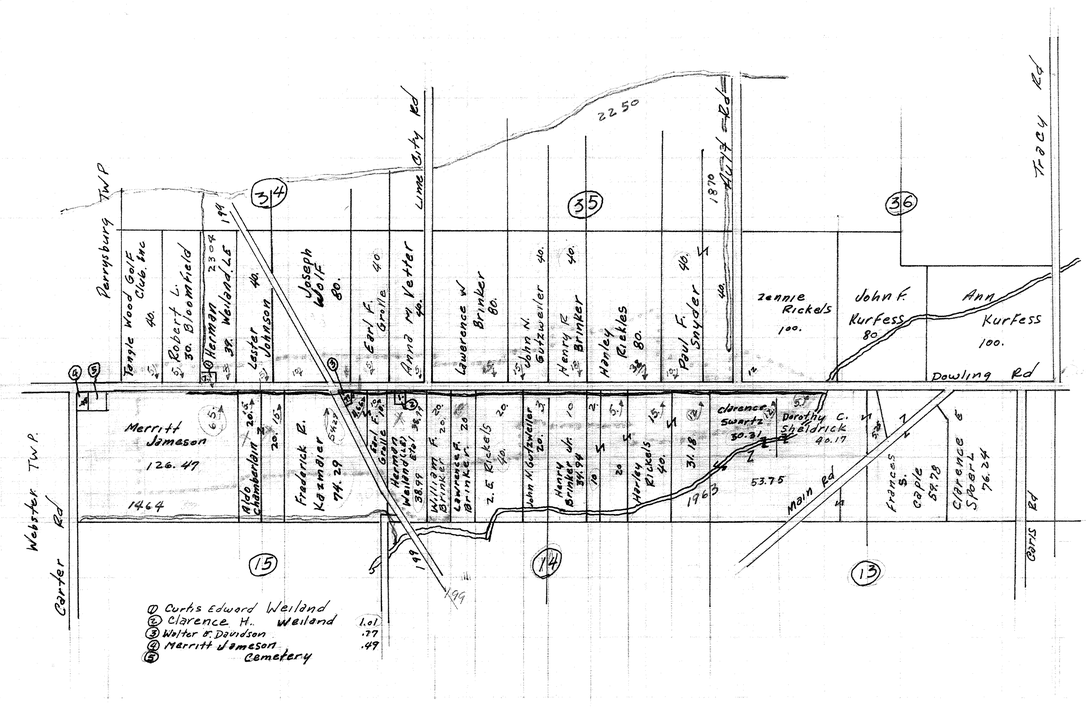
DIST-8
DITCH 8-8
