# PROFILE OF
# WILLIAM C. RIDEOUT DITCH
# No 2086

LAKE & ROSS TWPS, WOOD COUNTY, OHIO

DITCH BOOK 121 — BERT F. HENNING

DECEMBER 1952 — COUNTY ENGINEER

Work Done Private
By Hirzel

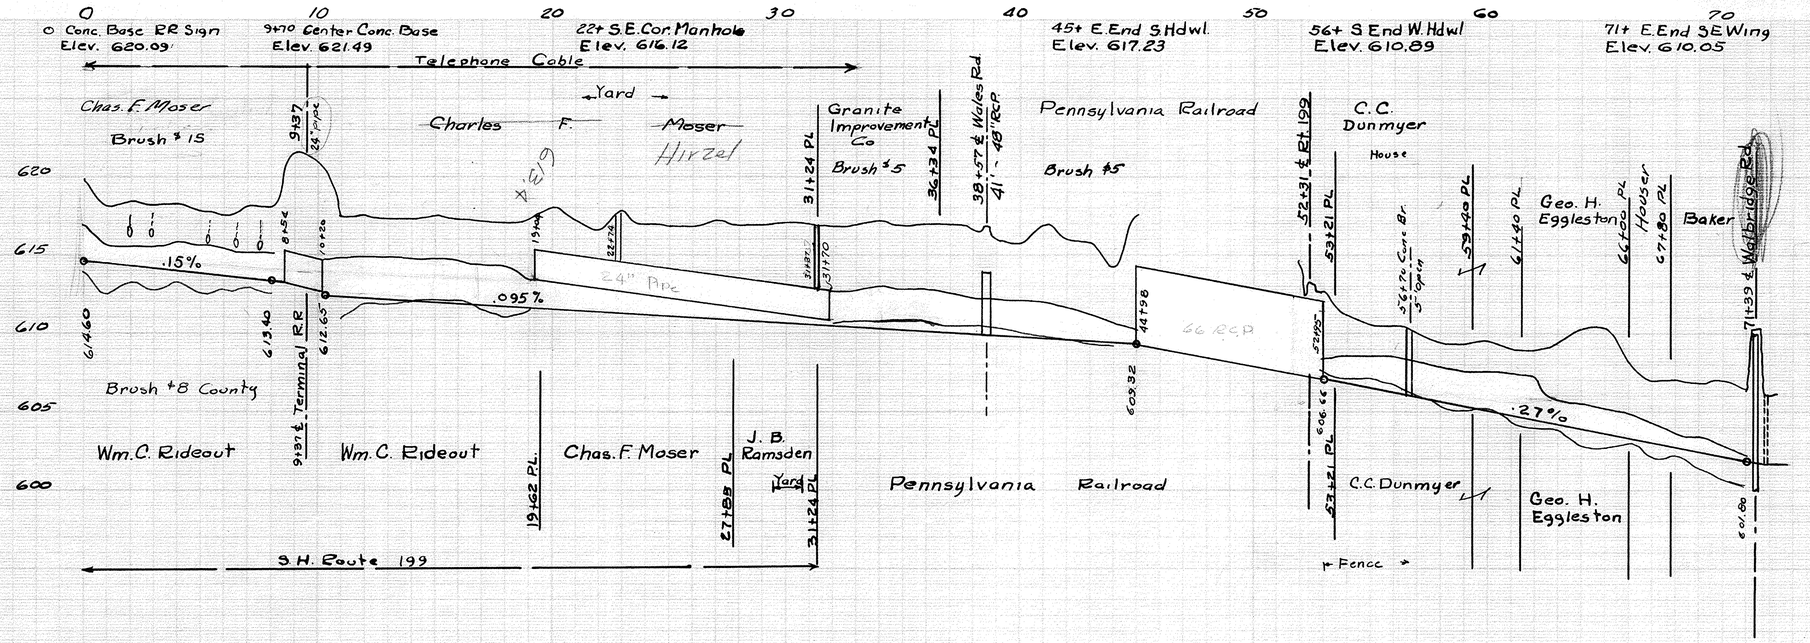


| Station | Cut | Top Width | Cubic Yards |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.93 | 16.8 | |
| 1 | 4.58 | 12.8 | 64 |
| 2 | 4.23 | 14.7 | 38 |
| 3 | 4.04 | 14.1 | 50 |
| 4 | 4.21 | 14.6 | 54 |
| 5 | 3.90 | 13.7 | 54 |
| 6 | 3.90 | 13.7 | 48 |
| 7 | 4.52 | 15.6 | 46 |
| 8 | 4.74 | 16.2 | 55 |
| 9 | | | 30 |
| 10 | 8.91 | | |
| 11 | 4.87 | 16.6 | 65 |
| 12 | 5.07 | 17.2 | 90 |
| 13 | 4.90 | 16.7 | 93 |
| 14 | 5.04 | 17.1 | 95 |
| 15 | 5.35 | 18.1 | 100 |
| 16 | 5.13 | 17.4 | 104 |
| 17 | 5.19 | 17.6 | 110 |
| 18 | 5.09 | 17.3 | 108 |
| 19 | 5.45 | 18.4 | 115 |
| 20 | 6.23 | | |
| 21 | 5.65 | | |
| 22 | 5.08 | | |
| 23 | 6.41 | | |
| 24 | 5.56 | | |
| 25 | 5.63 | | |
| 26 | 5.46 | | |
| 27 | 6.15 | | |
| 28 | 5.95 | | |
| 29 | 6.03 | | |
| 30 | 6.28 | | |
| 31 | 6.33 | | |
| 32 | 6.19 | 20.6 | 15 |
| 33 | 6.41 | 21.2 | 47 |
| 34 | 6.84 | 22.5 | 63 |
| 35 | 6.59 | 21.8 | 85 |
| 36 | 6.94 | 22.9 | 103 |
| 37 | 6.85 | 22.6 | 106 |
| 38 | 6.74 | 22.2 | 97 |
| 39 | 6.15 | 20.5 | 93 |
| 40 | 5.92 | 19.8 | 70 |
| 41 | 7.23 | 23.7 | 78 |
| 42 | 6.47 | 21.4 | 77 |
| 43 | 6.26 | 20.8 | 50 |
| 44 | 4.87 | 16.6 | 35 |
| 45 | 8.31 | 26.9 | 19 |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | 6.09 | 20.3 | |
| 54 | 4.65 | 16.0 | 26 |
| 55 | 4.37 | 15.1 | 48 |
| 56 | 4.61 | 15.8 | 64 |
| 57 | 4.45 | 15.4 | 60 |
| 58 | 4.12 | 14.3 | 57 |
| 59 | 4.28 | 14.9 | 55 |
| 60 | 4.75 | 16.3 | 59 |
| 61 | 4.53 | 15.6 | 74 |
| 62 | 4.63 | 15.9 | 82 |
| 63 | 5.40 | 18.2 | 81 |
| 64 | 6.50 | 21.5 | 103 |
| 65 | 6.79 | 22.1 | 115 |
| 66 | 5.01 | 17.0 | 85 |
| 67 | 4.09 | 14.3 | 65 |
| 68 | 4.43 | 15.3 | 64 |
| 69 | 4.92 | 15.3 | 61 |
| 70 | 4.92 | 16.8 | 72 |
| 71 | 4.69 | 16.1 | 63 |

3493 C.Y.
