BM: Sta. 97+
SE. Cor. E. Abut
Eleve. 685.49

BM: Sta. 160+
NE Cor. Top Step E. Abut.
Eleve. - 682.66

...le To Sta. 139 - 12' Above Ground

A.T.&T. Cable From Sta. 71

Fence

...nneth Green | Charles A. Potter (Brush #5) | Blanch I. Smith (Brush #4) | Hildreth Wood | Dale Tyson

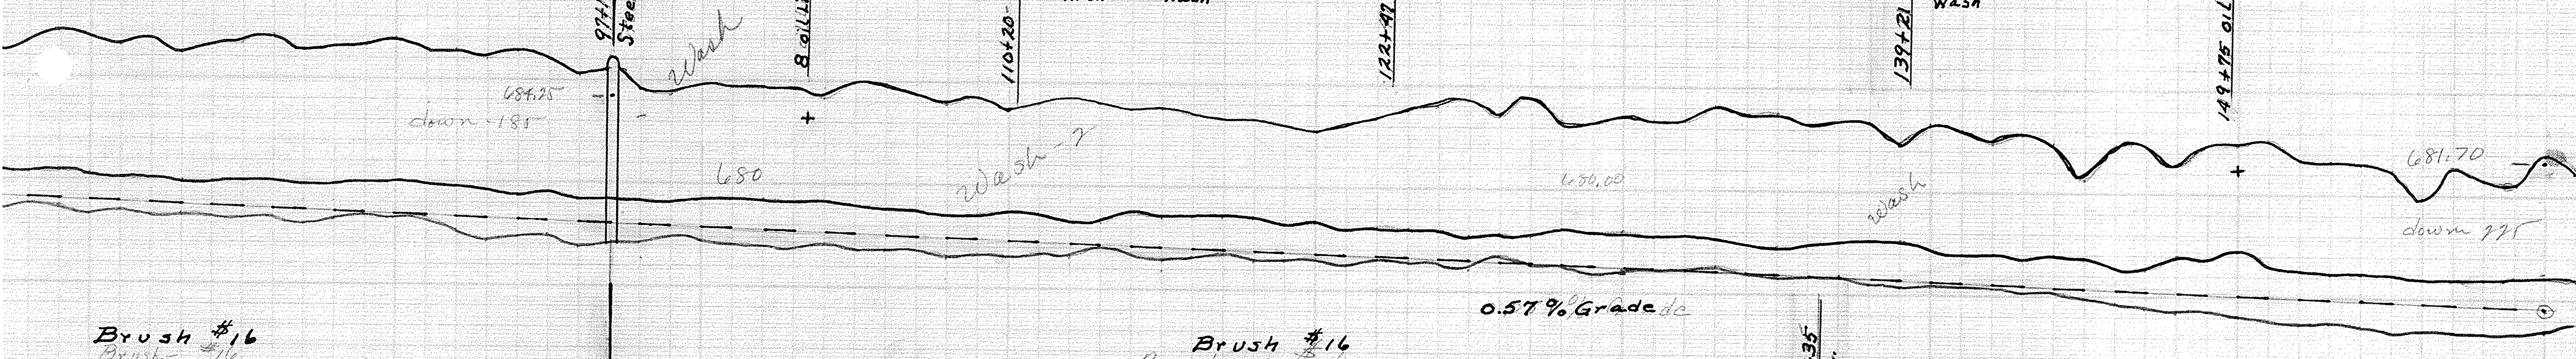

Brush #16
...en E. Solether | Cora B. Bursick (Brush #16) | Dale Tyson

189 200 222 266 244 178 178 206 239 239 206 206 206 189

Station	Ground	Grade	Depth
78	686.67	679.17	7.50
79	687.25	679.1	8.14
80	686.93	679.06	7.87
81	686.53	679.00	7.53
82	686.91	678.94	7.97
83	686.16	678.89	7.27
84	686.60	678.83	7.77
85	686.59	678.77	7.82
86	687.04	678.72	8.32
87	686.30	678.66	7.64
88	686.54	678.60	7.94
89	686.57	678.54	8.03
90	686.97	678.49	8.48
91	686.37	678.43	7.94
92	686.38	678.37	8.01
93	685.93	678.32	7.61
94	686.38	678.26	8.12
95	686.00	678.20	7.80
96	685.14	678.15	6.99
97	685.54	678.09	7.95
98	684.52	678.03	6.49
99	684.29	677.98	6.31
100	684.91	677.92	6.99
101	684.68	677.86	6.82
102	684.70	677.80	6.90
103	684.66	677.74	6.92
104	684.20	677.68	6.51
105	684.95	677.63	7.32
106	684.89	677.58	7.31
107	684.43	677.52	6.91
108	683.90	677.46	6.94
109	684.26	677.40	6.86
110	683.74	677.35	6.39
111	683.98	677.29	6.69
112	684.32	677.23	7.09
113	684.02	677.18	6.84
114	683.75	677.12	6.63
115	683.82	677.06	6.76
116	683.48	677.00	6.48
117	683.29	676.95	6.34
118	683.32	676.89	6.53
119	683.10	676.83	6.27
120	682.65	676.78	5.87
121	683.17	676.72	6.45
122	683.40	676.66	6.74
123	683.79	676.61	7.18
124	684.03	676.55	7.48
125	684.27	676.49	7.78
126	683.55	676.44	7.11
127	684.42	676.38	8.04
128	683.35	676.32	7.03
129	683.20	676.26	6.94
130	683.49	676.21	7.28
131	683.42	676.15	7.21
132	683.35	676.09	7.26
133	684.11	676.04	8.07
134	683.65	675.98	7.67
135	683.71	675.92	7.79
136	683.18	675.87	7.31
137	683.35	675.81	7.54
138	683.19	675.75	7.44
139	682.21	675.69	6.52
140	683.31	675.64	7.67
141	682.98	675.58	7.40
142	682.27	675.52	6.75
143	682.77	675.47	7.30
144	682.38	675.41	6.97
145	681.60	675.35	6.25
146	682.24	675.30	6.94
147	682.29	675.24	7.05
148	681.39	675.18	6.21
149	682.35	675.12	7.23
150	682.44	675.07	7.37
151	682.57	675.01	7.56
152	681.75	674.95	6.80
153	681.59	674.90	6.69
154	681.47	674.84	6.63
155	681.16	674.78	6.38
156	679.86	674.73	5.13
157	681.41	674.67	6.74
158	680.81	674.61	6.20
159	680.50	674.55	5.95
160	682.66	674.50	7.56

BM: Sta. 277+
SW. Cor. SW. Wing
Eleve. 679.26

BM: Sta. 286+
NW. Cor. NE. Wing
Eleve. 678.73

BM: Sta. 318+
SW. Cor. SW. Wing
Eleve. 673.43

BM: Sta. 325+
SW. Cor. Ret. Wall
Eleve. - 673.96

Schauweker (Brush #180) | Clyde O. Rowley (Brush #15) | Lester Shinew | Thomas E. Shinew | Velma Jimison (Brush #150) | E. G. Swartz (Brush #25)

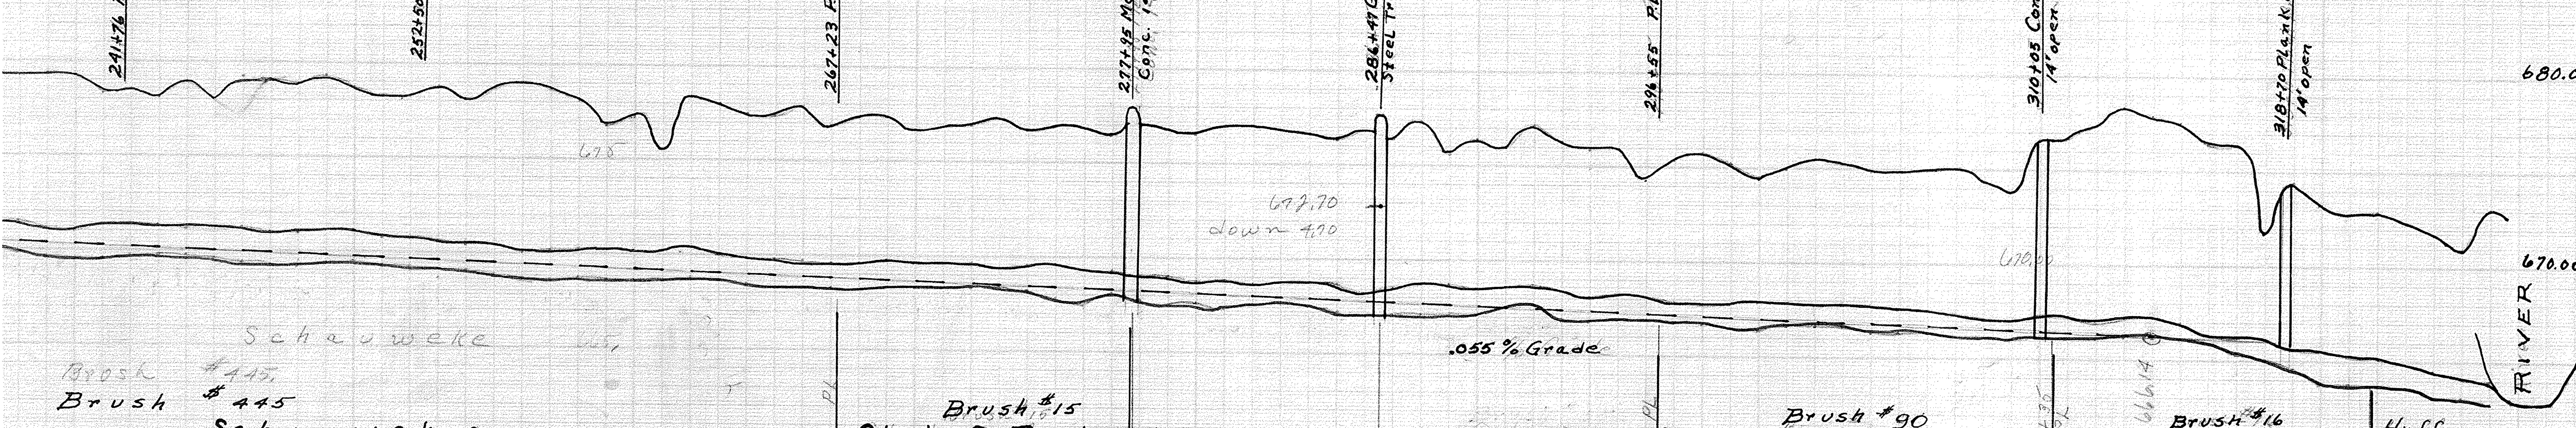

Brush #445
Schauweker | Clyde O. Rowley (Brush #15) | Lester Shinew | Thomas E. Shinew | Velma Jimison (Brush #90) | E. G. Swartz (Brush #16) | Huffman Road - Brush - 25

299 376 167 277 370 304 277 441 383 272 210 134 Total 11339

Station	Ground	Grade	Depth
238	679.21	670.21	9.00
239	679.35	670.15	[illegible]
240	679.26	670.10	9.16
241	678.26	670.04	8.22
242	678.56	669.99	8.57
243	678.13	669.93	8.20
244	679.01	669.88	9.13
245	677.96	669.82	8.14
246	679.24	669.77	9.47
247	679.17	669.71	9.46
248	678.87	669.66	9.21
249	679.38	669.60	9.38
250	678.73	669.55	9.18
251	678.26	669.49	8.77
252	678.22	669.44	8.78
253	678.71	669.38	9.33
254	678.06	669.33	8.73
255	678.69	669.27	9.32
256	679.04	669.22	9.87
257	678.65	669.16	9.49
258	678.07	669.11	8.96
259	676.78	669.05	7.73
260	677.27	669.00	8.27
261	675.53	668.94	6.59
262	678.40	668.89	9.51
263	678.02	668.83	9.19
264	677.51	668.78	8.73
265	677.40	668.72	8.68
266	677.91	668.67	9.24
267	676.77	668.61	8.16
268	677.34	668.56	8.78
269	677.82	668.50	8.82
270	676.69	668.45	8.24
271	676.86	668.39	8.47
272	676.93	668.34	8.59
273	677.23	668.28	8.95
274	676.70	668.23	8.47
275	676.89	668.17	8.72
276	676.92	668.12	8.80
277	676.43	668.06	8.37
278	677.17	668.01	9.16
279	676.81	667.95	8.86
280	676.48	667.90	8.58
281	676.99	667.84	9.15
282	677.03	667.79	9.24
283	676.84	667.73	9.11
284	676.62	667.68	8.94
285	676.40	667.62	8.78
286	676.08	667.57	8.41
287	676.04	667.51	8.53
288	677.32	667.46	9.86
289	675.50	667.40	8.10
290	676.38	667.35	9.03
291	675.95	667.29	8.66
292	677.21	667.24	9.97
293	676.32	667.18	9.14
294	675.87	667.13	8.74
295	675.94	667.07	8.87
296	674.26	667.02	7.24
297	675.38	666.96	8.42
298	675.81	666.91	8.90
299	675.21	666.85	8.36
300	674.48	666.80	7.68
301	674.95	666.74	8.21
302	675.46	666.69	8.77
303	675.18	666.63	8.55
304	674.85	666.58	8.27
305	674.88	666.52	8.36
306	674.96	666.47	8.49
307	675.06	666.41	8.65
308	674.31	666.36	7.95
309	673.78	666.30	7.48
310	676.59	666.25	10.34
311	676.65	666.19	10.46
312	677.42	666.14	10.28
313	678.35	666.08	12.27
314	677.94	666.03	11.91
315	677.57	665.97	11.60
316	676.35	665.92	11.43
317	676.40	665.86	10.54
318	671.76	665.81	5.95
319	674.50	665.75	8.75
320	673.32	665.70	
321	672.82	665.64	
322	672.87	665.59	
323	672.35	665.53	
324	671.66	665.48	
325	670.85	665.42	
326	673.04	665.37	

139 - 679.00

354 - 667.33 666.33
204 - 675.58
60 - 684.74
43 - 687.12

AUG 8 1968
