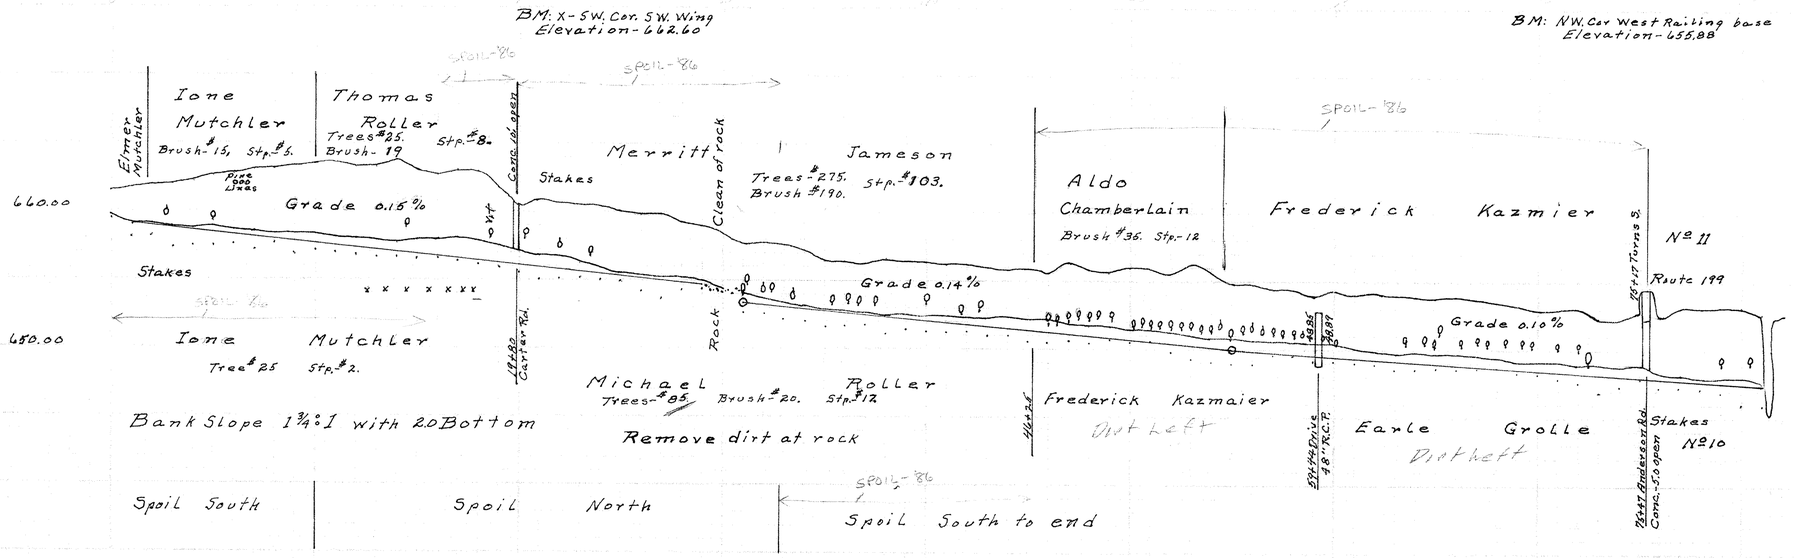

Station Number	Stake Elevation	Cut	Grade
0	661.40		No Work
1	661.87	2.47	2.0
2	661.95	3.10	4.4
3	662.02	3.32	6.0
4	662.18	3.43	7.8
5	662.37	4.17	10.0
6	662.74	4.51	12.4
7	663.09	4.99	15.8
8	663.11	5.16	19.8
9	663.30	5.50	19.9
10	663.43	5.78	19.8
11	663.62	6.12	19.7
12	663.84	5.91	19.4
13	663.85	6.05	19.8
14	663.80	6.75	19.8
15	663.61	6.11	19.7
16	662.46	5.91	19.2
17	663.02	6.42	21.5
18	662.95	6.50	21.5
19	661.78	5.48	15.9
20	660.30	4.15	10.0
21	660.88	4.88	10.0
22	660.63	4.78	8.8
23	660.51	4.81	8.3
24	660.29	4.74	8.3
25	659.96	4.56	6.1
26	659.80	4.65	6.1
27	659.78	4.68	4.0
28	659.24	4.29	4.0
29	659.01	4.21	4.0
30	658.52	3.87	4.0
31	657.73	3.33	3.4
32	657.76	3.46	4.0
33	657.66	3.50	4.0
34	657.22	3.67	4.0
35	656.44	3.56	4.0
36	656.41	3.61	4.0
37	656.21	4.10	4.0
38	656.56	4.05	4.0
39	656.37	4.13	4.0
40	656.31	4.07	4.0
41	656.11	4.35	4.0
42	656.25	4.20	4.0
43	655.94	4.19	4.0
44	655.81	4.13	6.0
45	655.91	4.13	7.7
46	656.47	4.34	9.3
47	656.24	5.06	8.8
48	655.81	4.75	9.3
49	655.58	4.66	9.3
50	655.25	5.17	10.0
51	655.91	5.27	9.3
52	655.45	5.33	8.8
53	656.28	5.50	9.3
54	656.72	5.50	9.3
55	656.85	4.77	10.0
56	656.78	4.80	10.0
57	656.53	4.65	10.0
58	656.43	4.65	7.7
59	656.33	4.25	7.7
60	656.24	4.68	4.7
61	656.01	4.53	4.6
62	656.09	4.71	4.6
63	655.99	4.71	4.8
64	655.93	4.75	4.4
65	655.79	4.71	4.4
66	655.90	4.92	4.4
67	655.68	4.80	5.2
68	655.68	4.74	6.4
69	655.52	4.69	6.4
70	655.28	4.31	6.4
71	655.29	4.47	7.2
72	655.03	4.55	7.2
73	655.22	4.74	6.4
74	655.34	4.16	6.4
75	655.75	4.47	8.8
76	655.64	4.56	8.8
77	655.10	5.22	9.3
78	655.11	5.33	9.3
79	655.18	5.57	6.0
80	655.15	5.22	6.0
81	655.70	5.27	4.0
81+43	—		314

Total

PLAT OF

F.R. KAZMAIER DITCH #2324
IN
MIDDLETON AND WEBSTER TOWNSHIPS
DITCH BOOK # 143
JULY-17-1969
DITCH #8-C
DISTRICT #8
WOOD COUNTY ENGINEER
MAX L. ROTHSCHILD

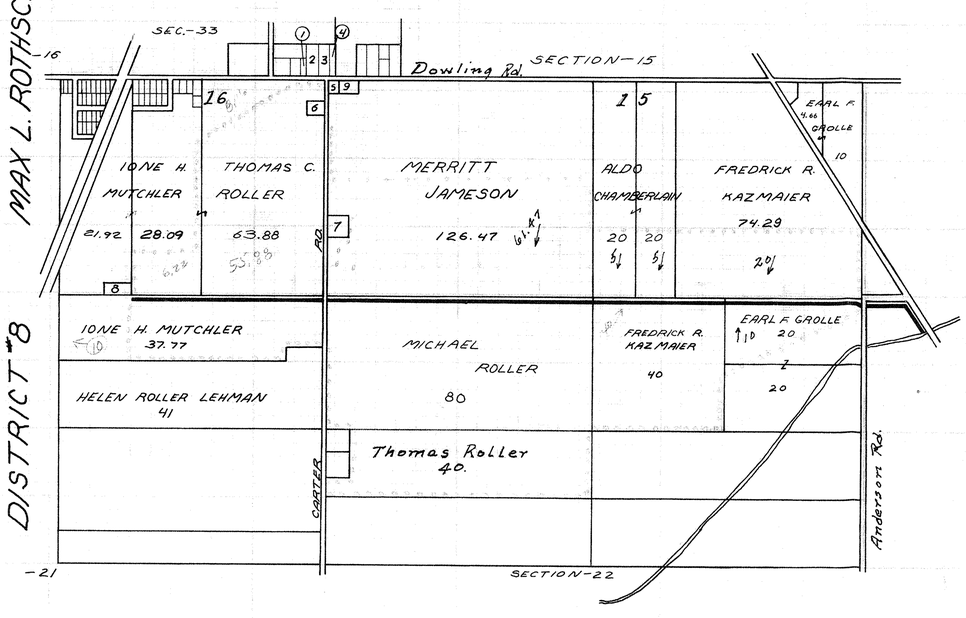

1 CHRIST EV. LUTH. CHURCH
2 BRAXTON N. COGER
3 SAME
4 SAME
5 MERRITT JAMESON
6 JAMES L. ROLLER
7 KENNARD L. OMAN
8 ELMER J. MUTCHLER
9 CEMETARY
10 Lawrence Brinker
11 Herman Weiland
